

Sommersemester 2025

Projekt Management in der Logistik



Dokumentation

Entenrennen auf der Breg

im Studiengang Wirtschaftsinformatik
der Hochschule Furtwangen | Furtwangen University

vorgelegt von

Ali Genc, Ali Usluy, Alexander Eremin

Referenten:

Herr Michael Kost

Eingereicht am

15. Juli 2025

1. Zusammenfassung (Executive Summary)

Das Entenrennen auf der Breg wurde erfolgreich durchgeführt. Unser Teilprojekt "TP Logistik" konnte alle geplanten Aufgaben zuverlässig umsetzen. Die Zielvorgabe von 1.600 Enten wurde eingehalten. Alle Bestellungen erfolgten rechtzeitig, und durch die Unterstützung von Frau Peuse-Rink verlief die Organisation reibungslos. Die Preise wurden erfolgreich an die Gewinner übermittelt und werden noch bis zum 20.07.2025 verteilt. Insgesamt war das Entenrennen für unser Team ein gelungenes Projekt mit positiver Resonanz und wertvollen Erfahrungen in der Projektplanung und -durchführung.

2. Einleitung mit Projektbeschreibung

Hintergrund und Kontext des Teilprojekts "TP Logistik" bestand darin, eine klare Struktur auf logistischer Ebene innerhalb des Gesamtprojekts „Entenrennen auf der Breg“ zu schaffen. Eine durchdachte und funktionierende Logistik ist essenziell für den Erfolg eines Projekts dieser Größenordnung.

Zu unseren Hauptaufgaben gehörte die Bestandsaufnahme der bereits vorhandenen Enten sowie die Beschaffung zusätzlicher Enten, um das Ziel von 1.600 Teilnehmern zu erreichen. Ziel unseres Teilprojekts war es, durch eine gut organisierte und strukturierte Herangehensweise sowohl das Gesamtprojekt als auch unser eigenes Teilprojekt effizient zu unterstützen.

Wir übernahmen außerdem die Koordination von Bestellwünschen anderer Teilprojekte (TPs) und setzten uns dafür regelmäßige Wochen-Deadlines, um frühzeitig alle Anforderungen zu erfassen. Um die Übersicht zu behalten, führten wir eine strukturierte Excel-Tabelle, in der sämtliche Enten erfasst und verwaltet wurden ein wesentliches Element für den Projekterfolg.

Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit war auch die enge Zusammenarbeit mit Frau Peuse-Rink, die uns tatkräftig unterstützte und die Bestellungen für uns ausführte. Durch diesen stetigen Austausch konnten wir sicherstellen, dass alle benötigten Materialien rechtzeitig zur Verfügung standen.

Zudem pflegten wir den Kontakt zu den Hausmeistern, die uns am Veranstaltungstag unterstützten und uns beispielsweise einen Radlader zur Verfügung stellten. Diese enge Zusammenarbeit war ein weiterer Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung des Entenrennens.

3. Rahmenbedingungen

Im Rahmen des Teilprojekts „TP Logistik“ gab es einige festgelegte, nicht veränderbare Rahmenbedingungen, an die wir uns halten mussten.

Die Lagerung der Materialien sollte hauptsächlich im H-Bau der Hochschule Furtwangen erfolgen, konkret in den dort zur Verfügung stehenden Schränken. Eine Ausnahme bildeten die Hauptpreise, wie zum Beispiel das iPad, welche aus Sicherheitsgründen privat gelagert wurden, um einen möglichen Verlust oder Diebstahl zu vermeiden.

Eine weitere verbindliche Rahmenbedingung war, dass sämtliche Bestellungen ausschließlich über Amazon erfolgen sollten. Diese Vorgabe basiert auf den Erfahrungen aus den Vorjahren und wurde seitens der Hochschule Furtwangen ausdrücklich so genehmigt. Wir haben uns konsequent an diese Vorgabe gehalten und die Bestellungen entsprechend durchgeführt.

4. Ist-Stand

Zu Beginn des Projekts wurde eine umfassende Bestandsaufnahme der vorhandenen Enten durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass die angestrebte Menge von 1.600 Enten noch lange nicht erreicht war. Dieser Umstand stellte eine der ersten Herausforderungen für das Teilprojekt Logistik dar.

Zudem verzögerte sich der offizielle Projektstart leicht, was zu zeitlichen Engpässen in mehreren Bereichen führte insbesondere bei der Sponsorensuche und bei der generellen Organisation des Projekts. Zum damaligen Zeitpunkt konnten noch nicht alle Termine und Abläufe klar definiert werden, was die Planung zusätzlich erschwerte.

Unsere Zielsetzung war es, insgesamt 1.600 Enten zu verkaufen und möglichst alle potenziellen Sponsoren aus unserer im Vorfeld erstellten Sponsorenliste zu gewinnen. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine vollständige Sicherheit bestand, war die Motivation hoch, das Projekt erfolgreich umzusetzen. Viele Entscheidungen und Entwicklungen ließen wir zunächst auf uns zukommen, in der Hoffnung, diese flexibel und lösungsorientiert bewältigen zu können.

5. Soll-Stand

Ziel des Teilprojekts „TP Logistik“ war es, einen strukturierten und reibungslosen Ablauf aller logistischen Prozesse innerhalb des Gesamtprojekts „Entenrennen auf der Breg“ sicherzustellen. Konkret sollte Folgendes erreicht werden:

- Organisation und Verwaltung von insgesamt 1.600 Enten, einschließlich einer genauen Bestandsaufnahme und gezielter Nachbestellung fehlender Enten.
- Termingerechte Koordination aller Bestellungen (z. B. Enten, Preise, Materialien) über Amazon, gemäß den Vorgaben der Hochschule Furtwangen.
- Aufbau und Pflege klarer Kommunikationsstrukturen mit den anderen Teilprojekten (z. B. regelmäßige Abfragen zu Bestellwünschen).
- Pflege und laufende Aktualisierung einer zentralen Excel-Tabelle zur Verwaltung der Bestände, um jederzeit den Überblick zu behalten.
- Organisation der Lagerung aller Materialien im H-Bau sowie sichere Verwahrung der Hauptpreise (z. B. iPad) zur Risikominimierung.
- Aufbau und Pflege der Zusammenarbeit mit unterstützenden Personen wie Frau Peuse-Rink (Bestellungen), den Hausmeistern (z. B. Bereitstellung eines Radladers am Renntag), sowie enger Austausch mit Artur, einem Mitglied des Entenrennen-Vereins.
- Regelmäßiger und aktiver Austausch mit dem Projektleiter Herrn Kost, um aktuelle Fortschritte, Herausforderungen und offene Punkte transparent zu kommunizieren.
- Zusätzlich war es unser Anspruch, als TP Logistik eine motivierende Rolle gegenüber den anderen Teilprojekten einzunehmen durch klare Kommunikation, strukturierte Arbeitsweise und aktives Nachfassen wollten wir zur Gesamtmotivation und Zielerreichung aller Teams beitragen.

Das Teilprojekt sollte somit nicht nur die logistische Grundlage für das Entenrennen schaffen, sondern auch eine tragende Rolle im organisatorischen Gesamtgefüge übernehmen.

6. Grob-Entwurf

Zu Beginn des Teilprojekts „TP Logistik“ wurden mehrere Umsetzungsvarianten diskutiert, insbesondere in den Bereichen Lagerung, Beschaffung und Kommunikation:

- Lagerung: Es stand zur Auswahl, ob alle Materialien zentral an der Hochschule (H-Bau) gelagert oder verteilt auf mehrere externe Orte (z. B. Privatwohnungen oder externe Lagerflächen) untergebracht werden sollten.
- Beschaffung: Neben dem Bestellweg über Amazon wurde auch die Möglichkeit geprüft, Materialien direkt über andere Plattformen oder lokale Händler zu beziehen.
- Kommunikation & Planung: Alternativ zu Word/Excel wurde überlegt, professionelle Projektmanagement-Tools wie Trello oder Asana einzusetzen.

- Materialverfolgung: Neben einfacher Excel-Tabellen war ein digitales Lagerverwaltungssystem im Gespräch, mit Barcode-Scan und Etikettierung.

Aufzeigen von bewusst nicht bewerteten Umsetzungsvarianten inkl. Begründung

- Verteilte Lagerung an mehreren Orten wurde ausgeschlossen, da dies die Koordination erheblich erschwert hätte und Sicherheitsrisiken (Verlust, Unzugänglichkeit) gestiegen wären. Die zentrale Lagerung im H-Bau sowie kurz vor dem Event zusätzlich in der Garage der Metzgerei Braun wurde als effizienteste Lösung bewertet.
- Alternative Bestellplattformen wurden verworfen, da die Hochschule Furtwangen die Bestellabwicklung über Amazon als verbindlich vorgibt.
- Komplexe Projektmanagement-Tools wurden aufgrund der kurzen Projektlaufzeit und begrenzten Einarbeitungszeit abgelehnt. Word und Excel ermöglichten eine direkte und sofort einsetzbare Lösung.

Bewertung der Umsetzungsvarianten und Ausführung der Entscheidung. Die letztlich umgesetzte Variante sah folgende Elemente vor:

- Zentrale Lagerung im H-Bau der Hochschule sowie temporär in der Garage der Metzgerei Braun.
- Bestellungen ausschließlich über Amazon, durchgeführt durch Frau Annette Peuse-Rink.
- Kommunikation über Microsoft Teams, Excel und WhatsApp, um alle Projektmitglieder zeitnah zu erreichen.
- Einsatz einer strukturierten Excel-Tabelle für Bestände, Bedarfsermittlung und Kommissionierung.

Diese Kombination stellte sich als die effizienteste und praktikabelste Lösung heraus, da sie sowohl die logistischen Anforderungen als auch die hochschulinternen Rahmenbedingungen optimal erfüllte. Gleichzeitig wurde so eine gute Übersichtlichkeit und klare Aufgabenverteilung innerhalb des Teams gewährleistet.

7. Feinkonzept

Basierend auf dem gewählten Umsetzungspfad wurde ein detailliertes Feinkonzept für das Teilprojekt „TP Logistik“ entwickelt. Ziel war es, eine strukturierte, transparente und effiziente Durchführung aller logistischen Prozesse zu gewährleisten.

Lagerung

- Hauptlagerung im H-Bau der Hochschule Furtwangen
- Zusätzliche Lagerfläche ab dem 19.06.2025 in der Garage der Metzgerei Braun

- Trennung der Materialien nach Kategorien: Gummienten, Preise, Etiketten, Transportmittel
- Hochwertige Preise (z. B. iPad) wurden privat gesichert gelagert (z. B. bei Ali Genc)

Bestellverfahren

Das Team setzte ein klar strukturiertes, siebenschrittiges Verfahren um (siehe auch Anhang "Bestellverfahren_Entenrennen"):

1. Bedarfsmeldung der Teilprojekte per Formular oder WhatsApp
2. Prüfung auf Lagerbestand durch das Logistikteam
3. Erstellung der Bestellanfrage inkl. Artikelbeschreibung, Menge, Preis, Begründung
4. Genehmigung durch Herrn Kost
5. Bestellung über Amazon durch Frau Peuse-Rink
6. Dokumentation & Wareneingang
7. Rückmeldung an das jeweilige Teilprojekt

Kommissionierung

- Erstellung von Kommissionierlisten je Teilprojekt
- Bereitstellung der Materialien nach Teamwunsch
- Rückmeldungspflicht der Teams bei Materialübergabe (per Signatur oder WhatsApp)


Kommunikation und Tools

- Excel-Tabellen für Lagerverwaltung, Stücklisten und Nachverfolgung
- Kommunikation über Microsoft Teams (formell), WhatsApp (kurzfristig)
- Wöchentliche Abstimmungen mit dem Projektleiter Herrn Kost

Qualitätssicherung

- Doppelte Prüfung von Wareneingängen
- Rückmeldungskontrolle durch Abhaken im System
- Verwendung einer aktuellen Inventur-Tabelle (siehe Anhang) zur Nachverfolgung

8. Meilensteine, Zeit- und Ressourcenplanung: Plan

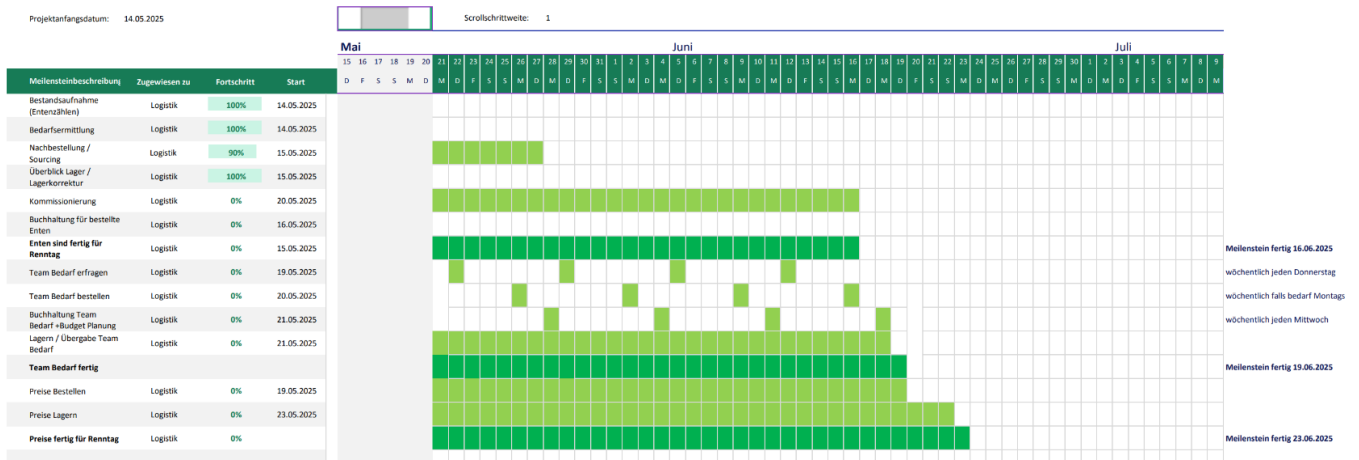

Für das Teilprojekt „TP Logistik“ wurde ein strukturierter Zeitplan in Form eines Gantt-Diagramms erstellt (siehe Anhang), der die wichtigsten Aufgaben, Zuständigkeiten und zeitlichen Abfolgen abbildete. Ziel war es, alle logistischen Prozesse frühzeitig zu koordinieren, Engpässe zu vermeiden und die Anforderungen aller Teilprojekte rechtzeitig zu erfüllen.

Phase 1: Vorbereitung (KW 20, ab 14.05.2025):

- Start des Projekts mit Bestandsaufnahme der vorhandenen Enten
- Bedarfsermittlung durch Abfrage bei den Teilprojekten
- Aufbau erster Lagerstrukturen im H-Bau
- Erstellung der ersten Excel-Übersichten (Lagerliste, Gantt-Diagramm)

Phase 2: Beschaffung & Strukturierung (KW 21–24):

- Durchführung der Nachbestellungen (u. a. 500 Gummienten, Preise)
- Strukturierung der Lagerung und Etikettierung der Enten
- Laufende Aktualisierung der Inventur und Bedarfsliste
- Vorbereitung der zusätzlichen Lagerfläche (Metzgerei Braun)

Phase 3: Kommissionierung & Übergabe (KW 25–26):

- Kommissionierung der Materialien nach Teilprojekten
- Lagerung der Preise und Übergabematerialien
- Finale Übergabe aller Materialien an das Eventteam am Renntag

Datum	Meilenstein
14.05.2025	Projektstart Logistik – Start der Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung
15.05.2025	Nachbestellung von 500 Enten und Materialien über Amazon
16.06.2025	Alle Enten gezählt, strukturiert und beschriftet
19.06.2025	Alle Teilprojekt-Bedarfe eingegangen und Bestellungen abgeschlossen
23.06.2025	Preise und Materialien vollständig kommissioniert und einsatzbereit
26.06.2025	Übergabe aller Materialien an die Rennleitung (Veranstaltungstag)

Verwendete Planungshilfen

- Gantt-Diagramm (TP1_Gantt_Diagramm.pdf)
- Excel-Stückliste und Lagerübersicht
- Wöchentliche Statusabfragen in Microsoft Teams
- Visuelle Lagerzonenaufteilung (siehe Strukturplan im Anhang)

9. Zeit- und Ressourceneinsatz: Ist

Zeitlicher Verlauf und zentrale Ereignisse

- Am 14.05.2025 begann das Teilprojekt mit der Bestandsaufnahme der vorhandenen Gummienten (Ergebnis: ca. 1.000 Stück).
- Am 15.05.2025 wurde eine Nachbestellung von 500 Enten über Amazon veranlasst, die Lieferung traf vollständig und rechtzeitig ein.
- In der Zeit vom 16. bis 23.06.2025 erfolgten die Etikettierung, Lagerung und Kommissionierung der Materialien im H-Bau.
- Ab dem 19.06.2025 wurde zusätzlich die Garage der Metzgerei Braun als Lagerfläche genutzt, um Platzengpässe zu vermeiden.
- Die Übergabe der Materialien an die Rennleitung fand wie geplant am 26.06.2025 vor Ort statt. Alle Komponenten waren vollständig vorbereitet.

Ressourceneinsatz im Projektverlauf:

Personelle Ressourcen:

- 3 Teammitglieder übernahmen Lagerverwaltung, Materialfluss und Kommunikation.
- Frau Annette Peuse-Rink führte alle Bestellungen über Amazon durch.

- Hausmeister der HFU unterstützten am Eventtag mit einem Radlader beim Materialtransport.

Materielle Ressourcen:

- 1.500 Gummienten wurden gezählt, etikettiert und verwaltet.
- Es kamen Lagerkisten, Säcke und Rollwagen für Transport und Sortierung zum Einsatz.
- Die Preise wurden teilweise im Lager, teilweise aus Sicherheitsgründen privat gelagert (z. B. iPad).
- Etiketten, Marker, Listen und Druckmaterialien wurden für Organisation und Beschriftung verwendet.

Infrastrukturelle und digitale Mittel:

- Zentrale Lagerung im H-Bau der Hochschule Furtwangen
- Zusätzliche Fläche in der Garage der Metzgerei Braun (ab 19.06.)
- Excel-Tabellen zur Bestandsverwaltung und Kommissionierung
- Microsoft Teams für Dokumentenablage und Projektabstimmung
- WhatsApp für spontane Kommunikation, Rückmeldungen und Übergabebestätigungen

10. Umsetzung & Ergebnisse

Die Umsetzung des Teilprojekts „TP Logistik“ erfolgte in mehreren aufeinander abgestimmten Schritten. Zu Beginn wurde eine strukturierte Bestandsaufnahme der Gummienten durchgeführt und alle vorhandenen Materialien erfasst. Auf Grundlage dieser Daten wurden gezielte Nachbestellungen bestellt.

Parallel wurde eine Lagerstruktur im H-Bau der Hochschule eingerichtet. Diese umfasste die Trennung nach Materialtypen (z. B. Enten, Preise, Material). Zur Verwaltung wurde eine Excel-Tabelle angelegt, die laufend gepflegt wurde.

Ab dem 19.06.2025 wurde zusätzlich eine zweite Lagerfläche (Garage Metzgerei Braun) genutzt, um die Mengen effektiv unterzubringen. Viele Sachen die am Renntag gebraucht wurden, wurden in der Garage gelagert. Am 26.06.2025, dem Renntag, wurde das komplette Material an die Rennleitung übergeben.

Einsatz von Darstellungen (Beispiele)

- Excel-Stücklisten zur Verwaltung der Enten, Materialien und Preise (siehe Anhang)

- Gantt-Diagramm zur Zeitplanung (Projektplan_Gantt-Diagramm.pdf)
- Lagerstrukturplan (TP1_Strukturplan_Lagerung&Kommissionierung.pdf)
- Bestellverfahren-Dokumentation (Bestellverfahren_Entenrennen.docx)

Herausforderungen und deren Bewältigung

Während der Umsetzung traten insbesondere zwei praktische Herausforderungen auf:

1. Neue Enten einpflegen und nummerieren:

Nach der Nachbestellung mussten alle neuen Gummienten zunächst mit Etiketten versehen, anschließend manuell nummeriert (z. B. mit wasserfestem Stift) und schließlich in die zentrale Excel-Liste eingepflegt werden. Dieser Prozess war zeitintensiv und erforderte höchste Konzentration, um Fehler bei der Zuordnung und Nummerierung zu vermeiden.

2. Sortieren nach verkauften Enten:

Eine weitere Herausforderung bestand darin, bereits gepackte Beutel mit z. B. 200 Enten (Nummern 1–200) zu prüfen, wenn bestimmte Enten (z. B. Nummer 50 oder 62) nicht verkauft worden waren. Diese mussten gezielt aus den Beuteln herausgesucht und entnommen werden. Dies erforderte viel manuelle Arbeit und sorgte für hohen Aufwand bei der Kommissionierung.

Beide Aufgaben wurden im Team bewältigt, indem klare Checklisten, systematische Arbeitsabläufe und gegenseitige Kontrolle eingeführt wurden. Trotz des hohen manuellen Aufwands konnten alle Enten korrekt verwaltet und einsatzbereit übergeben werden.

11. Analyse und Bewertung

Das Teilprojekt „TP Logistik“ konnte seine Aufgaben im Gesamtprojekt „Entenrennen auf der Breg“ insgesamt erfolgreich und weitgehend planmäßig umsetzen. Die Koordination der Lagerung, die strukturierte Beschaffung und die Kommissionierung der Materialien funktionierten zuverlässig. Besonders positiv hervorzuheben ist die vollständige und Materialübergabe am Veranstaltungstag, die durch die sorgfältige Vorbereitung des Teams ermöglicht wurde.

Erfüllung der Projektziele

- Beschaffung, Erfassung und Nummerierung von 1.600 Enten
- Aufbau einer funktionsfähigen Lagerstruktur im H-Bau + Zusatzfläche
- Zentrale Materialverwaltung via Excel, mit klarer Zuordnung
- Sichere und vollständige Kommissionierung aller Preise und Materialien
- Reibungslose Kommunikation mit Teilprojekten und Projektleitung

- Einhaltung des Zeitplans trotz hoher Detailarbeit und manueller Aufgaben

12. Lessons Learned

Im Rahmen unseres Teilprojekts „TP Logistik“ konnten wir zahlreiche wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die nicht nur für uns persönlich, sondern auch für zukünftige Projekte hilfreich sein können. Eine der wichtigsten Erfahrungen war, dass ein früher Projektstart entscheidend für den späteren Erfolg ist. Durch die anfängliche Verzögerung hatten wir mit zeitlichen Engpässen zu kämpfen, insbesondere bei der Sponsorensuche und der allgemeinen Projektkoordination. Diese Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig mit der Arbeit zu beginnen und klare Strukturen von Anfang an aufzubauen.

Besonders positiv hat sich unsere strukturierte Arbeitsweise ausgewirkt. Die sorgfältige Bestandsaufnahme und die kontinuierliche Pflege unserer Excel-Tabelle halfen uns dabei, jederzeit den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Auch die klare Aufgabenverteilung innerhalb unseres Teams war ein Schlüsselfaktor für das reibungslose Funktionieren der logistischen Abläufe.

Ein weiterer zentraler Punkt war die Bedeutung von Kommunikation. Der regelmäßige Kontakt mit dem Projektleiter Herrn Kost, mit Artur vom Entenrennen-Verein sowie mit Frau Peuse-Rink, die unsere Bestellungen übernommen hat, war essenziell. Ebenso wichtig war der Austausch mit den anderen Teilprojekten, den wir aktiv suchten, um sie zu motivieren, zu unterstützen und offene Punkte frühzeitig zu klären. Diese Kommunikation trug entscheidend zur Gesamtkoordination und zum Teamzusammenhalt bei.

Wir haben außerdem gelernt, wie wichtig Flexibilität und Eigenverantwortung im Projektalltag sind. In vielen Situationen mussten wir spontan handeln, Lösungen finden und Verantwortung übernehmen, besonders dann, wenn noch nicht alle Termine oder Informationen vorlagen. Diese Fähigkeit, auch unter Unsicherheit zielorientiert zu arbeiten, war eine zentrale Kompetenz, die wir im Laufe des Projekts weiterentwickelt haben.

Für zukünftige Projekte empfehlen wir, möglichst früh mit der Planung und Umsetzung zu beginnen, regelmäßige Kommunikationsroutinen einzuführen und zentrale Organisationstools konsequent zu nutzen. Außerdem sollten Verantwortlichkeiten klar definiert und ausreichende Zeitpuffer eingeplant werden, insbesondere bei externen Abhängigkeiten wie Bestellungen oder Sponsorenzusagen. Insgesamt hat uns das Projekt gezeigt, wie viel durch gute Struktur, klare Kommunikation und gegenseitige Unterstützung erreicht werden kann.

13. Schlussfolgerung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Teilprojekt „TP Logistik“ einen wesentlichen Beitrag zum erfolgreichen Ablauf des Entenrennens auf der Breg geleistet hat. Durch eine strukturierte Herangehensweise, klare Organisation und eine verlässliche Kommunikation mit allen Beteiligten konnten wir unsere Ziele weitgehend erreichen. Die Bestandsaufnahme, die Koordination der Bestellungen sowie die Verwaltung der Materialien verliefen trotz anfänglicher Herausforderungen effizient und lösungsorientiert. Besonders hilfreich war dabei die enge Zusammenarbeit mit dem Projektleiter Herrn Kost, mit Artur vom Entenrennen-Verein sowie mit Frau Peuse-Rink, die uns bei der Abwicklung der Bestellungen unterstützte.

Unsere wichtigsten Erkenntnisse aus dem Projekt waren die Bedeutung eines frühzeitigen Starts, die Notwendigkeit klarer Kommunikationsstrukturen und die Stärke von Teamarbeit und Eigenverantwortung. Zudem zeigte sich, dass Motivation und aktive Unterstützung der anderen Teilprojekte ein wichtiger Beitrag für den Gesamterfolg waren.

Für zukünftige Projekte bietet sich die Möglichkeit, auf den Erfahrungen dieses Jahres aufzubauen. Denkbar wäre beispielsweise die Weiterentwicklung eines digitalen Verwaltungssystems für die Enten oder eine zentrale Projektplattform zur Koordination aller Teilprojekte. Auch der frühzeitige Aufbau eines Sponsoren pools könnte langfristig zu mehr Planungssicherheit beitragen. Insgesamt bietet das Entenrennen großes Potenzial, sich als feste, gut organisierte Veranstaltung weiterzuentwickeln, sowohl logistisch als auch organisatorisch. Unser Teilprojekt hat hierfür eine stabile Grundlage geschaffen, auf die zukünftige Teams aufbauen können.

14. Anhänge

- Zugangsdaten
- Programmiercode
- Zusätzliche Dokumente und Materialien
- Tabellen, Diagramme und Grafiken

15. Persönliche Reflexion

Persönliche Reflexion – Ali Genc

Das Modul und insbesondere das Projekt „Entenrennen auf der Breg“ haben mir die Möglichkeit gegeben, einen praxisnahen Einblick in die Welt des Projektmanagements zu gewinnen. Ich konnte nicht nur organisatorische und logistische Aufgaben übernehmen, sondern auch Verantwortung innerhalb meines Teilprojekts TP Logistik tragen. Dabei habe ich gemerkt, wie vielseitig und anspruchsvoll Projektarbeit sein kann von der

Planung über die Kommunikation bis hin zur Umsetzung vor Ort. Besonders wertvoll war für mich das Erlernen grundlegender Projektmanagementkonzepte, wie zum Beispiel Zieldefinition, Aufgabenverteilung, Zeitmanagement und Schnittstellenkommunikation zwischen verschiedenen Teilprojekten. Durch diese Erfahrung habe ich eine klare Richtung für meinen beruflichen Weg gefunden: Ich möchte mich zukünftig intensiver mit Projektmanagement beschäftigen und in diesem Bereich weiterentwickeln. Zu meinen persönlichen Überraschungen gehörte auf jeden Fall, dass nicht immer alles reibungslos funktioniert, selbst wenn alle im Team motiviert sind. Es gab Phasen, in denen die Zusammenarbeit nicht bei allen Teammitgliedern zu hundert Prozent funktionierte, sei es durch Missverständnisse, Verzögerungen oder fehlende Kommunikation. Anfangs war das frustrierend, aber im Laufe des Projekts habe ich gelernt, wie wichtig es ist, in solchen Situationen nicht aufzugeben, sondern aktiv das Gespräch zu suchen, die Gruppe zu motivieren und einen konstruktiven Umgang mit Herausforderungen zu finden. Letztlich konnte sich das Team immer wieder fangen und das war eine sehr prägende Erfahrung für mich. Zu sehen, wie man gemeinsam trotz Schwierigkeiten ein Ziel erreicht, hat mir ein starkes Gefühl von Zusammenhalt und persönlichem Erfolg gegeben.

Besonders stolz bin ich darauf, dass wir unser Ziel von 1.600 Enten tatsächlich erreicht haben. Die strukturierte Planung, die gezielte Kommunikation mit den anderen Teilprojekten und die enge Abstimmung mit wichtigen Ansprechpersonen wie Herrn Kost (Projektleitung), Frau Peuse-Rink (Bestellungen) und Artur (Vereinsmitglied) haben maßgeblich dazu beigetragen. Auch die Unterstützung der Hausmeister, die uns am Renntag den Radlader zur Verfügung gestellt haben, hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Netzwerk ist. All das hat mir verdeutlicht, wie komplex die Koordination eines scheinbar kleinen Projekts in der Realität sein kann – und wie entscheidend der Blick fürs Detail ist.

Für zukünftige Projekte würde ich einige Dinge definitiv anders angehen. Rückblickend hätte es zum Beispiel viel Zeit und Abstimmung gespart, wenn jede Teilprojektgruppe eine verantwortliche Person für die Sponsorensuche gestellt hätte, statt das gesamte Team damit zu betrauen. So hätten Dopplungen, Unklarheiten und unnötiger Aufwand vermieden werden können. Auch wäre es sinnvoll gewesen, in jeder Gruppe eine Person zu bestimmen, die als feste Ansprechperson jederzeit erreichbar ist für interne Absprachen ebenso wie für den Austausch mit anderen Teams oder der Projektleitung. Eine klare Kommunikationsstruktur spart viel Zeit und verhindert Missverständnisse.

Insgesamt bin ich sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich im Rahmen dieses Projekts machen durfte. Ich habe nicht nur fachlich sehr viel gelernt, sondern auch persönlich. Projektarbeit bedeutet mehr als nur Aufgaben zu erledigen, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, im Team zu funktionieren, sich auf andere einzulassen und gemeinsam Lösungen zu finden. Dieses Projekt hat mir nicht nur neue berufliche Perspektiven eröffnet, sondern mir auch gezeigt, wie erfüllend es sein kann, an einem Ziel zu arbeiten und es mit Ausdauer, Engagement und Teamgeist zu erreichen.

Persönliche Reflexion – Alexander Eremin

Das Projekt Entenrennen war für mich eine richtig gute Erfahrung. Ich habe dabei sehr viel gelernt, nicht nur über Organisation, sondern auch über Zusammenarbeit, Verantwortung und darüber, wie man in stressigen Situationen den Überblick behält. Besonders spannend fand ich, dass wir alles selbst in die Hand nehmen durften, der Sponsorsuche bis zum fertigen Rennen. Es war sehr praxisnah und abwechslungsreich. Das Fach Entenrennen hat mir insgesamt richtig viel Spaß gemacht. Es war mal etwas anderes als der normale Studienalltag.

Ich habe gemerkt, wie wichtig gute Planung ist. Ohne unsere Excel-Listen, die klare Aufgabenverteilung und die regelmäßige Absprache im Team hätten wir das Projekt nicht so erfolgreich umsetzen können. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir es tatsächlich geschafft haben, 1.600 Enten zu verkaufen. Am Anfang war das noch ein riesiges Ziel, aber am Ende hat alles so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt hatten.

Herausfordernd war vor allem der Zeitdruck. Neben dem Projekt liefen auch noch andere Abgaben und Präsentationen, was manchmal ganz schön anstrengend war. Trotzdem haben wir als Team gut zusammengearbeitet und uns gegenseitig unterstützt. Auch wenn manches spontan entschieden werden musste, haben wir immer eine Lösung gefunden. Ich habe gelernt, wie wichtig Kommunikation ist und wie hilfreich es sein kann, einfach nachzufragen oder direkt Dinge zu klären, bevor es zu Missverständnissen kommt.

Durch das Projekt habe ich auch gemerkt, dass mich das Thema Projektmanagement wirklich interessiert. Ich fand es spannend, alles zu planen, zu strukturieren und dann zu sehen, wie es am Ende auch wirklich funktioniert.

Wenn ich nochmal so ein Projekt machen würde, würde ich auf jeden Fall früher anfangen. Man unterschätzt oft, wie viel Zeit kleine Aufgaben kosten, zum Beispiel das Nummerieren der Enten oder das Sortieren nach gekauften Nummern. Aber genau solche Erfahrungen machen so ein Projekt wertvoll. Ich bin froh, dass ich dabei war.

Persönliche Reflexion – Ali Usluy

Das Projekt „Entenrennen auf der Breg“ war für mich eine intensive, lehrreiche und spannende Erfahrung, die mir gezeigt hat, was es heißt, im Team ein reales Projekt mit echtem Ergebnis umzusetzen. Vor allem die Verantwortung innerhalb unseres Teilprojekts TP Logistik hat mir neue Einblicke in die Abläufe und Herausforderungen einer professionellen Projektorganisation gegeben. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, strukturiert zu arbeiten, Prioritäten zu setzen und dabei flexibel auf neue Situationen zu reagieren. Besonders hilfreich war dabei, dass wir in vielen Bereichen selbstständig Entscheidungen treffen durften, das hat mir gezeigt, dass ich durchaus in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig im Team abgestimmt zu handeln.

Was mich überrascht hat, war die Vielfalt an Aufgaben, die im Hintergrund eines solchen Events zu bewältigen sind. Anfangs dachte ich, Logistik sei hauptsächlich eine Frage von Organisation und Planung, aber schnell wurde klar, dass Kommunikation,

Teamabsprachen und Koordination mit anderen Teilprojekten eine mindestens genauso große Rolle spielen. Es gab Momente, in denen Informationen nicht sofort flossen oder Zuständigkeiten unklar waren. Solche Situationen waren herausfordernd, aber ich habe gelernt, wie wichtig es ist, ruhig zu bleiben, aktiv nachzufragen und gegebenenfalls auch mal einen Schritt mehr zu machen, damit das Team weiterkommt.

Ein echtes Erfolgserlebnis war für mich, als wir die Enten organisiert und den Überblick mithilfe der Excel-Tabelle behalten haben. Dass wir es wirklich geschafft haben, alle 1.600 Enten zu verkaufen und am Renntag pünktlich einsatzbereit waren, hat mir gezeigt, dass sich gute Vorbereitung und Durchhaltevermögen am Ende auszahlen. Auch die Zusammenarbeit mit externen Personen wie Frau Peuse-Rink oder den Hausmeistern war eine neue Erfahrung, hier konnte ich lernen, wie wichtig es ist, verlässlich zu sein und klare Absprachen zu treffen.

Für zukünftige Projekte würde ich empfehlen, schon ganz zu Beginn noch mehr Klarheit über Rollen und Zuständigkeiten zu schaffen. Ein festes Kommunikationskonzept, bei dem jede Gruppe eine feste Ansprechperson hat, hätte vieles vereinfacht. Auch die Sponsorsuche hätte meiner Meinung nach effizienter ablaufen können, wenn jede Teilprojektgruppe eine gezielte Person dafür benannt hätte. Trotzdem haben wir es letztlich geschafft, auch diese Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, und genau das hat das Projekt so wertvoll gemacht.

Rückblickend bin ich stolz darauf, Teil dieses Projekts gewesen zu sein. Es war nicht immer einfach, aber genau das hat es spannend gemacht. Ich nehme viele praktische Erfahrungen mit, habe neue Seiten an mir kennengelernt und weiß jetzt, dass mir die Arbeit in Projekten wirklich liegt. Ich freue mich auf weitere Herausforderungen dieser Art und bin dankbar für die Gelegenheit, so praxisnah lernen zu dürfen.
